

《議題 2》


統合新病院開院に向けた取り組みについて

1. 統合新病院開院に向けた取り組みについて

(1) 統合新病院開院準備室の設立

- ▶ 令和8年4月より市立伊丹病院内に「統合新病院開院準備室」を設立
- ▶ 近畿中央病院元副院長を統括責任者として、課長級以上の17名で構成
- ▶ 公立学校共済組合本部・病院統合準備センターのメンバーを加えた「統括部会」で進捗管理等を実施
- ▶ 統括部会と専門部会を設置し開院準備を推進
- ▶ 統合新病院開院日決定への取り組み

(2) 統括部会と専門部会の連携

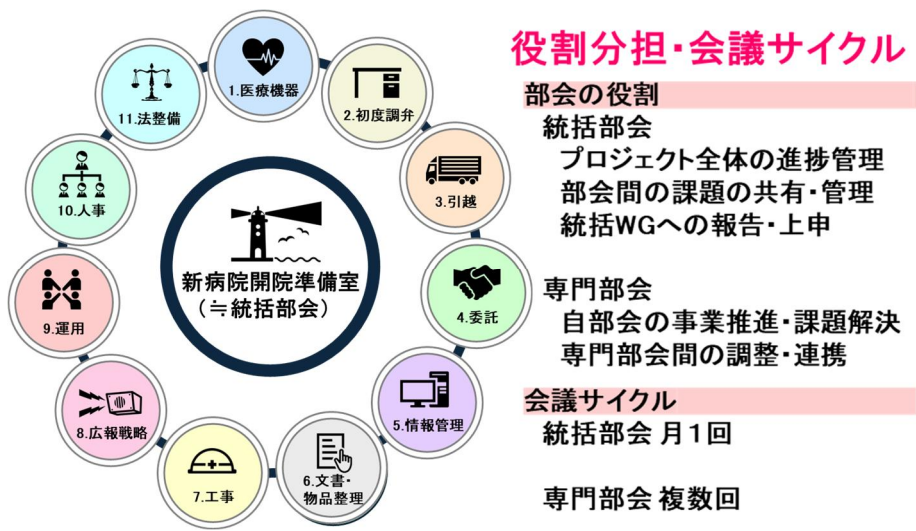

(3) 統合新病院開院日の決定までの取り組み

- ▶ 工事受注者と開院準備スケジュールを調整
- ▶ 統合新病院開院準備室において開院準備スケジュールを策定
- ▶ 令和9年度後半の開院日を決定
- ▶ 開院1年前を目途に開院日を公表

令和8年度				令和9年度			
4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
工事受注者と引渡時期・開院準備スケジュールの調整				工事の進捗管理 開院準備作業の調整			
開院準備スケジュール策定				開院準備			
(開院準備室) 各専門部会での課題解決・統括部会での情報共有、進捗管理							
開院日決定公表				統合新病院開院			

1. 統合新病院開院に向けた取り組みについて


(4) 統合新病院整備工事の状況 **計画通り進捗**



航空写真(敷地南側より)
西棟躯体工事を施工



全景写真(敷地北側より)
タワークレーンで柱や梁などの構造体を楊重

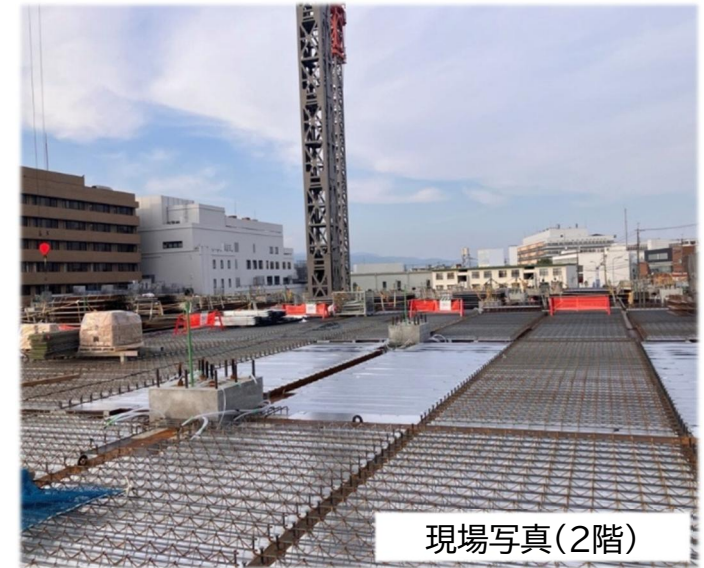

現場写真(2階)
2階の金属製床版を敷設し、コンクリート打設



現場写真(1階南西)
1階柱、梁設置し、2階金属製床版を順次敷設




現場写真(1階北東)
放射線治療(リニアック)部を鉄筋コンクリートで建設中



現場写真(地下1階)
構造体は完了。外壁設置の後、内装工事着手

1. 統合新病院開院に向けた取り組みについて

(5) 医療機器整備の進捗状況 計画通り進捗

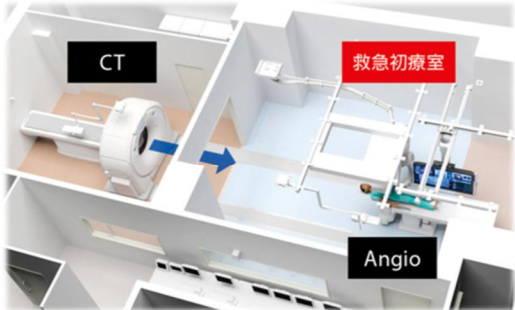令和7年度整備済	令和8年度		令和9年度
	業者選定→製造・納入準備		設置調整
心臓用血管造影装置 	救急用2room血管造影CT(ハイブリッド ER)  手術用血管造影装置(ハイブリッド OP) 		業者選定→納入
1.5T磁気共鳴画像診断装置(MRI) 	放射線治療装置(リニアック)  3.0T磁気共鳴画像診断装置(MRI)  ロボット支援手術機器 		病棟関連機器(ベッド)  外来関連機器(カート) 
	血管造影検査装置(アンギオ)  コンピューター断層撮影装置(CT)  統合医療情報システム 薬剤等搬送ロボット 救急初療関連機器 検査関連機器 栄養管理厨房機器 薬剤関連機器		外来関連機器(ICU) 

統合新病院開院
